

H26
4月

みちづくりかわら版
第103号

地域の夢と希望のみちづくり

平成26年3月26日発行

京都府道路公社建設事務所

野田川橋梁で送り出し架設を行っています！

2月22日からスタートした野田川橋梁の送り出し架設は、順調に進んでいます。

3月14日～17日にかけて第3回の送り出しを行った際には、今後夜間作業でお世話になる与謝野町石田区のみなさんに、作業状況と実際にどのくらいの音がするのか等を現地で確認していただきました。参加していただいた地元の皆様には、思ったより静かな工事だということをご理解いただけたと考えています。しかしながら、夜間での工事となりますので、しばらくはご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

また、せっかくの機会ですので、府や市町の技術職員のみなさんに対しても見学会を開催しました。

一目でわかる送り出し進捗状況



送り出しスタート（2月22日）



第1回終了（2月22日）



第2回終了（3月6日）



第3回終了（3月17日）



P7橋脚のペントにPR用の懸垂幕を設置しました！



ことらちゃん



石田区民の皆様への説明会
（3月15日・17日）



府・市・町の技術職員への
工事見学会（3月14日）

第14トンネルの湧水量が多くなりました。

第14トンネルでは、トンネル湧水量が想定より多くなってきたため、当初設置した濁水処理施設では追いつかなくなり、新たに施設を追加しました。

現場のみなさんは、岩盤との戦いだけでなく、日々水との戦いにも明け暮れています。



新しい濁水処理設備を坑口横に設置しました。



水処理の状況です。

たんばあやべの小部屋



瑞穂インターチェンジの工事状況です（国施工）

※ここでは、丹波綾部道路（丹波～京丹波わち）の工事状況をお知らせします。

裏面もご覧下さい。

工事状況 山陰近畿自動車道(野田川大宮道路)



工事に伴い振動・騒音等ご近所の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、出来るだけ低減に努めて参ります。
安全を最優先に工事を進めますのでご理解、ご協力をお願いします。

大宮森本ICランプ築造(その2)工事 マルキ・山崎JV




ランプ橋の橋台背面の埋め戻しをしています。

第14トンネル工事 大林・公成・吉川JV



切羽(トンネル先端部)の状況です。
3月20日現在の掘削延長は1,422mです！

野田川橋梁上部(その2)工事 川田・宮地JV

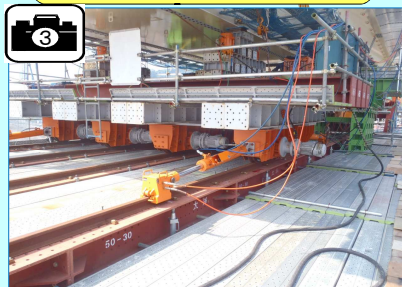

交互推進ジャッキにより橋桁を送り出します。

与謝天橋立IC(その1)工事



野田川橋梁下に排水路と擁壁を設置しています。

安全パトロール(3月24日)



工事安全連絡会による安全パトロールを川田・宮地JVの現場で実施しました。

凡例

- 完成箇所
- 施工中箇所
- 未着手箇所

