

みちづくりかわら版
第86号

H24 地域の夢と希望のみちづくり 平成24年9月26日発行
10月 京都府道路公社建設事務所

すすきも目立ち、赤とんぼも舞い始め
秋を感じるようになりました

工事状況
鳥取豊岡宮津自動車道～野田川大宮道路～


現在の施工状況

- 野田川橋梁（仮称）の橋台・橋脚工事を進めています。
（橋梁下部工その3） P7橋脚は、完成しました。P8は10月16日から河川内工事に再着手します。
（橋梁下部工その4） P9、P10橋脚は、ボーリングにより支持地盤位置の確認をしました。
（橋梁上部工その1） 工場で桁製作中。9月上旬から現場において支保工（ベント設備）の組み立てが始まっています。
- 第14トンネル（仮称）工事 トンネルの掘削延長は、114メートルです。
- 埋蔵文化財調査 石田城跡の調査では、引き続き面的調査を行っています。
- 与謝天橋立IC消雪装置工事 散水管、送水管を設置中です。

今後の工事予定

- 野田川橋梁上部その2工事（P6～A2） 鋼開断面箱桁橋（入札手続き中）
- 野田川橋梁（仮称）の橋台（A2）他工事
- 大宮森本ランプ道路築造（その2）工事

宮津市須津～与謝野町石田工区

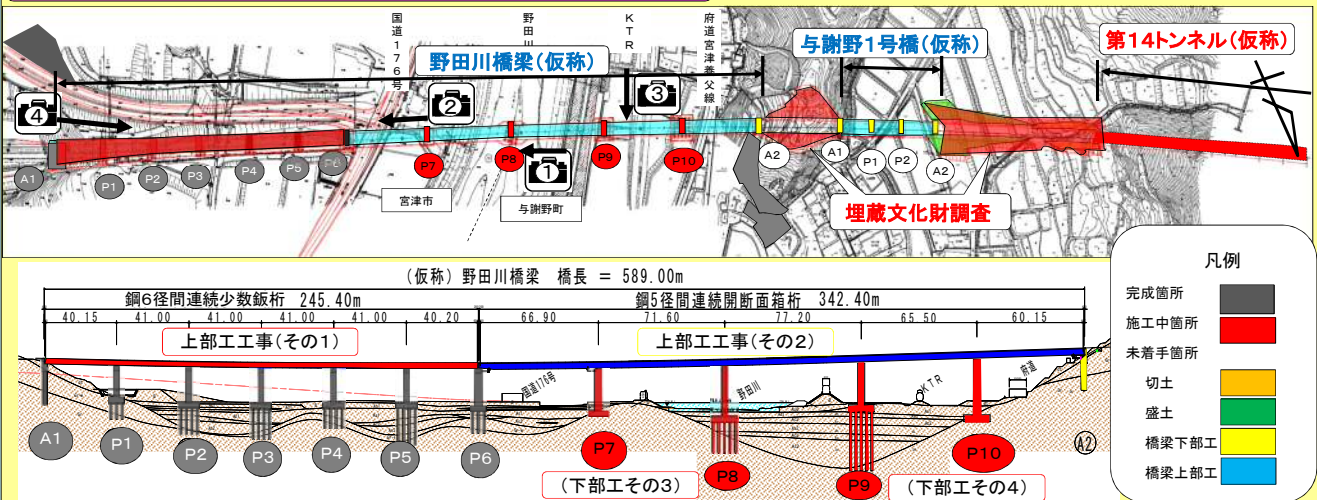

野田川橋梁 P7橋脚

柱部のコンクリート打設が完了しました。足場の解体に先立ち橋脚の寸法確認をしました。



野田川橋梁 P9橋脚

ボーリング調査により支持地盤位置の再確認を行いました。



野田川橋梁 上部その1

野田川橋梁上部工（その1）工場製作
・9月7日に桁の溶接検査。
・9月21日に仮組立検査。
・10月上旬に塗装検査を予定。
工場検査終了後、輸送開始です。



工場検査状況




野田川橋梁上部工（その1）現地
・現地ではベント（仮設橋脚「写真緑色の柱」）を設置し桁を架設する準備を進めています。
・架設は10月中旬の予定。

裏面もご覧下さい。


京丹後市大宮町 三重～森本工区

森本工業団地

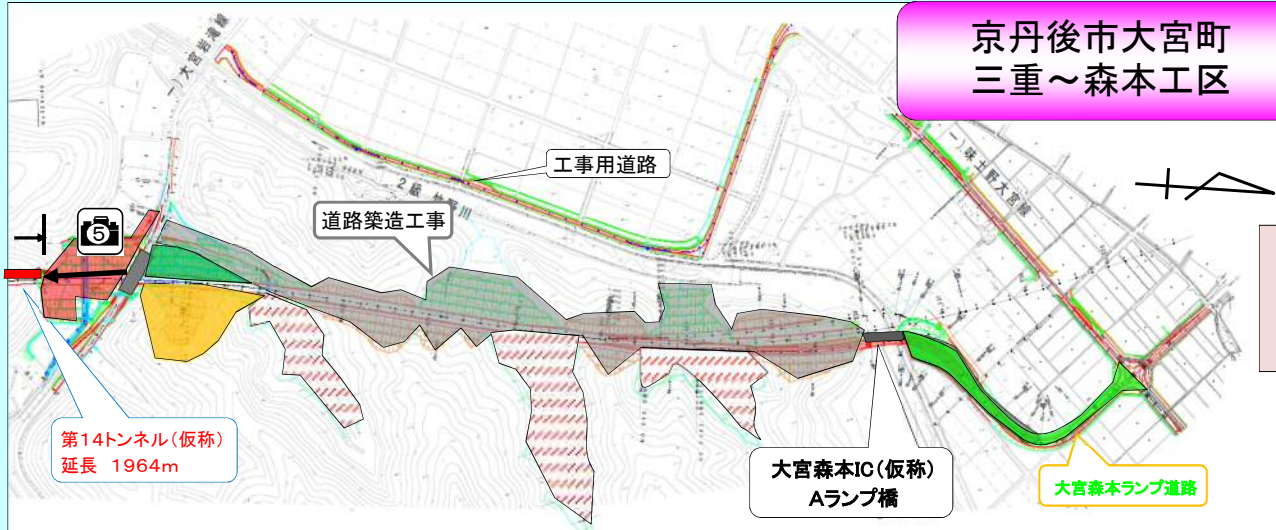

100m地点において掘削面の土砂の肌落ちも少なくなり、多少硬くなってきましたが、まだ軟弱な地層が続いています。ダイナマイトはまだ使用していません。

坑口部においては、大型の換気用送風機を設置しトンネル構内の作業環境の改善を行い、防音扉を設置し騒音防止対策を図っています。

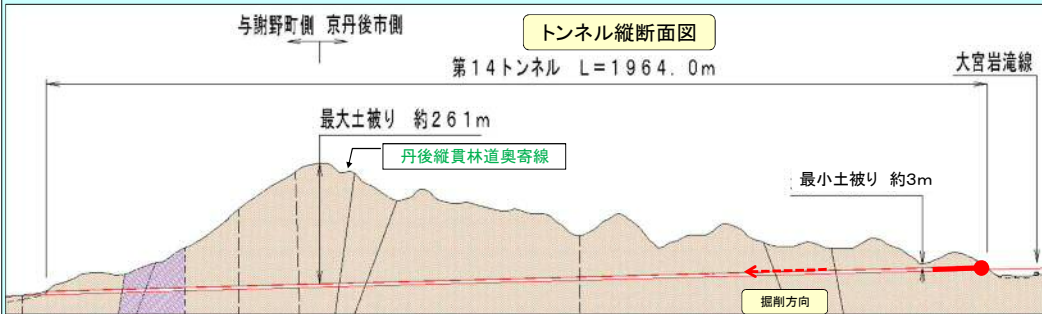

第14トンネル 掘削状況

9月24日現在
掘削延長 114m



トンネル工事見学会を開催

- 9月19日(水)：京丹後市役所技術職員研修 23名
 - 9月24日(月)：京丹後市市議会議員団現地視察 20名
- トンネルや野田川橋梁の工事現場を見て頂きました。



京丹後市大宮町三坂地内の国道312号沿いにPR看板を設置しました。工事の進捗よく状況も分かるようにしています。

京都縦貫道 ご利用大感謝祭

- 「美味しさいっぱい 沿線特産市2012」を開催。多数のご来場ありがとうございました。
- 9月22日(土) 23日(日) 京都縦貫道 由良川PA内
 - 京都府道路公社が沿線地域の方々とともに実施するイベントで、今年で4回目の開催。来場者 約3800名(速報値)
 - 京都縦貫道沿線地域の24団体(過去最多)が新鮮野菜や地魚やスイーツなどを販売 大盛況でした。
 - 沿線地域のPRのため、「まゆまる」「チョコキまる」「ふなやん」「コッペちゃん」「かさぼう」のゆるキャラが応援。



大盛況の特産市!!
魚・野菜の販売に大だかり



もてるもてるゆるキャラ

かっこいい!
パトロール隊員
